

(主)大社日御碕線外 日御碕工区外 防災安全交付金(交安 2 種)工事

からのお知らせ (2 月末)

地元皆様にはますますご隆昌の事と存じます。

現場での今月作業内容ですが、A 箇所・C 箇所は終了しましたので、その様子を一部紹介いたします。


また、今後は B 箇所・カーブミラー設置工事を行います。引き続き地元関係者の皆様にはご通行に関しご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【先月 (2 月) の進捗】

- 先月までの進捗率：67.7% (予定 74.6%)

【今月 (3 月) の予定】

- 今月の予定進捗率：100% (塩津工区・坂浦工区もあります。)
- B 箇所①ガードレール撤去②舗装版・擁壁取壊し③ガードレール基礎④舗装⑤ガードレール設置⑥区画線
- カーブミラー設置 (1 箇所)
- B 箇所及びカーブミラー箇所施工時は終日片側交互通行です。(予定日：下記)

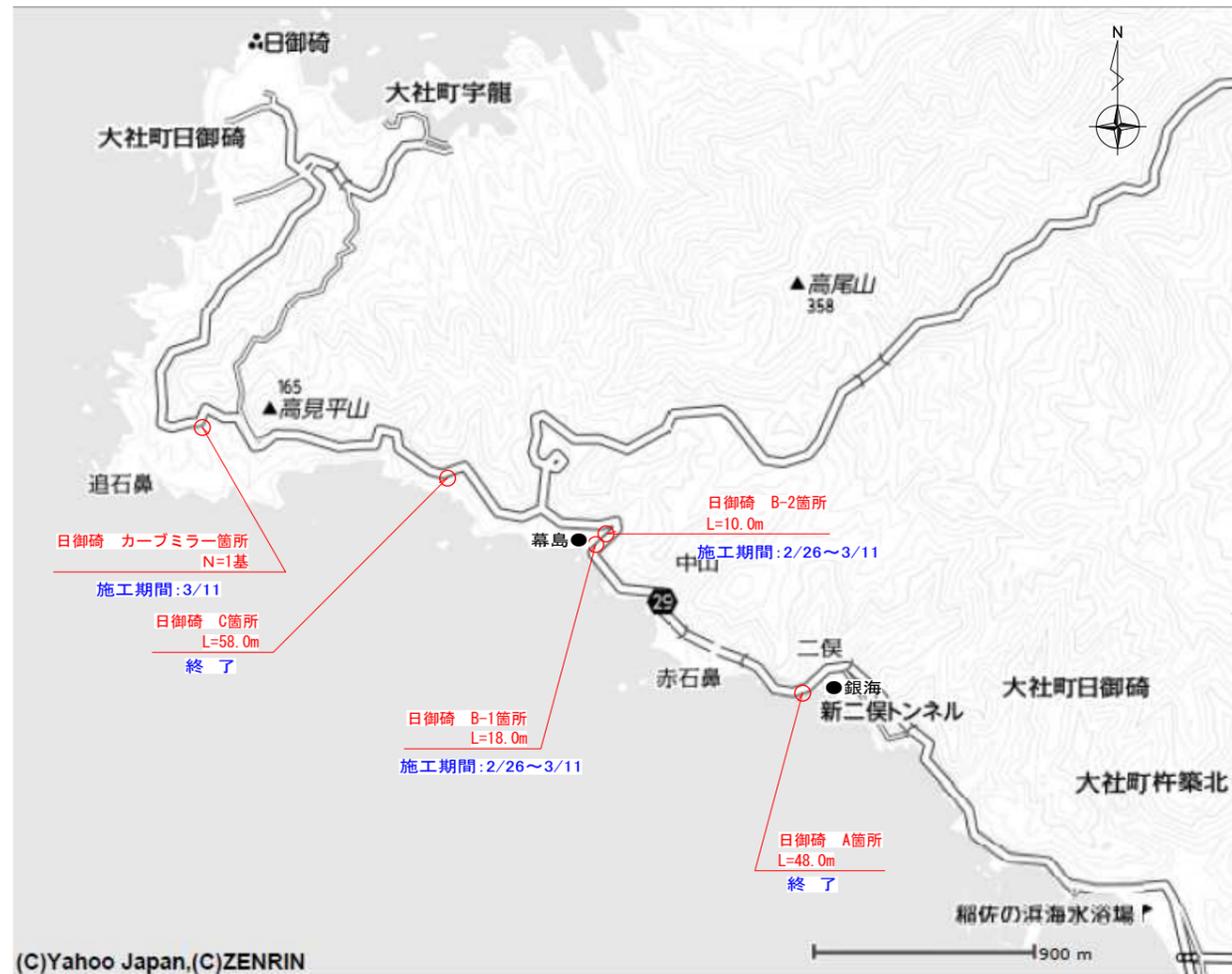

なお、区画線の復旧を 3 月 11 日 (午前中) に施工予定です。
 施工順 C 箇所→B-1 箇所→B-2 箇所→C 箇所
 各箇所の施工時間は 1 時間程度です。上記順で交通規制をします。
 区画線終了後にカーブミラー施工予定です。

【2 月度 現場作業状況】



※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

<p>【 本 社 】 有限会社 嘉村建設 所在地：出雲市宇那手町 355 番地 電 話：(0853) 48-0130 ファックス：(0853) 48-0168 U R L：http://www.kamuken.co.jp</p>	<p>【 作 業 所 】 (主)大社日御碕線外 日御碕工区外 防災安全交付金(交安 2 種)工事作業事務所 所在地：出雲市大社町日御碕 172 番 電 話：080-5623-7621 E-mail：k-shinji@kamuken.co.jp 現場代理人 嘉村 慎次</p>
---	--

引き続きご迷惑をおかけしますが
 ご協力お願い致します。

