

正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第 1 期

現場からのお知らせ（第 5 号）

初春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。地元皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。

本工事も工事着手から約 5 ヶ月となりますが、現在諸般の事情により工程に遅れが生じております。これに伴い、発注者である島根県と協議した所、下記のように工期延期となりました。皆様方には色々ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工期：(変更前) 平成 29 年 1 月 31 日
(変更後) 平成 29 年 3 月 24 日

【今月（1 月）の進捗】

- 先月までの進捗率：60%
- 1 月中の進捗はありませんでした。

【来月以降（2 月～3 月）の予定】

- E 工区の完了（掘削、路盤）
- 伐採・搬出作業の完了

【お知らせ】

・ 交通規制について

本工事では片側交互通行として警察等に申請しておりますが、全ての現道は通行可能です。ただし、道路直近での近接工事となりますため、皆さんに安全に通行していただくために、通行時（車両及び歩行者）は工事を停止し、安全に誘導いたします。

・ 休工日について

1 月 20 日～2 月 20 日までの休工日は下記の予定となっております。（工程の都合により変更する場合があります。）

1 月 22 日（日）
1 月 29 日（日）
2 月 5 日（日）
2 月 12 日（日）
2 月 19 日（日）


休工日での緊急のご連絡は下記へご連絡願います。

有限会社 嘉村建設
現場代理人：鎌田淳文
TEL（携帯）：090-3632-0913

【1 月度 現場状況】

平成 29 年 1 月 17 日撮影

工事区域全景

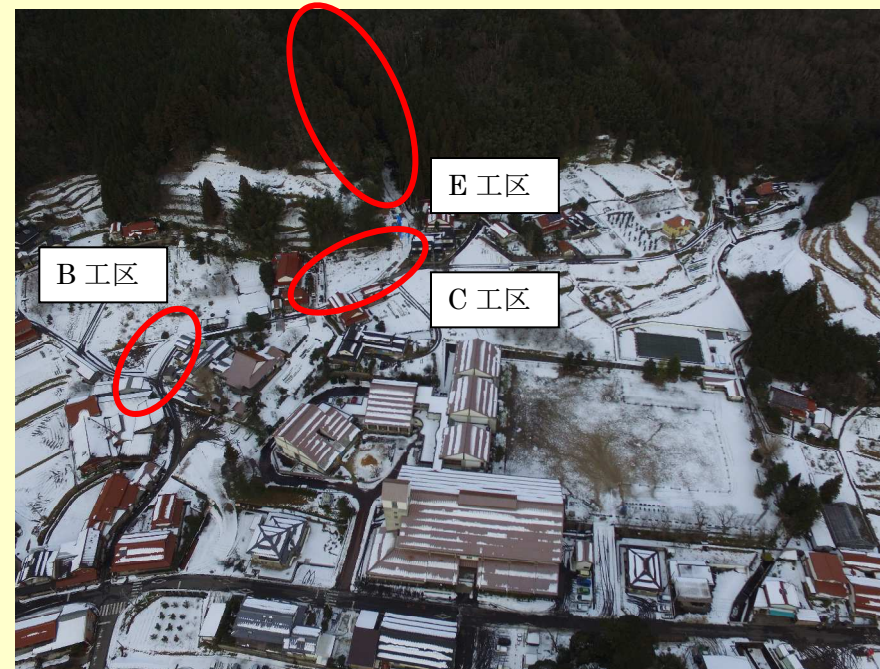

【お知らせ】 現在残土搬出に伴う受入地の選定、工法の検討により、先月に引き続き現場が停滞しております。作業の開始につきましては現在の所 2 月初旬を目標としておりますが、協議の進捗により前後する場合がありますことをご了承願います。

※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

有限会社 嘉村建設【本 社】

所在地：出雲市宇那手町 355 番

電話：(0853) 48-0130

ファックス：(0853) 48-0168

URL：<http://www.kamuken.co.jp>

E-mail：kamada@kamuken.co.jp

現場代理人：鎌田 淳文
